AI READINESS ASSESSMENT · 2026.09.23

기초 시스템을 현장 실행력으로 전환할 단계

송우산업의 AI 훈련코치 사전 수준진단을 바탕으로 강점과 격차를 확인하고, 데이터 표준화에서 현장 PoC까지 실행 순서를 제안합니다.

LEVEL 2 사전진단

종합 진단 점수

42 / 100

시스템 기반과 AI 이해는 양호하나 데이터 분석·검증과 제조 AI 적용 역량을 보완해야 합니다.

SCORE PROFILE

강점은 시스템과 AI 이해, 병목은 분석·검증·현장 적용입니다

점수는 기술 도입 순서를 정하기 위한 출발점입니다. 낮은 항목부터 무조건 구축하기보다 선행 관계와 현장 효과를 함께 고려했습니다.

가장 높은 기반

80%

A1 시스템 활용

교육 수용성

70%

B1 AI 이해·활용

핵심 역량 격차


20%

B3 노코드 분석

현장 적용 준비

20%

B6 제조·피지컬 AI

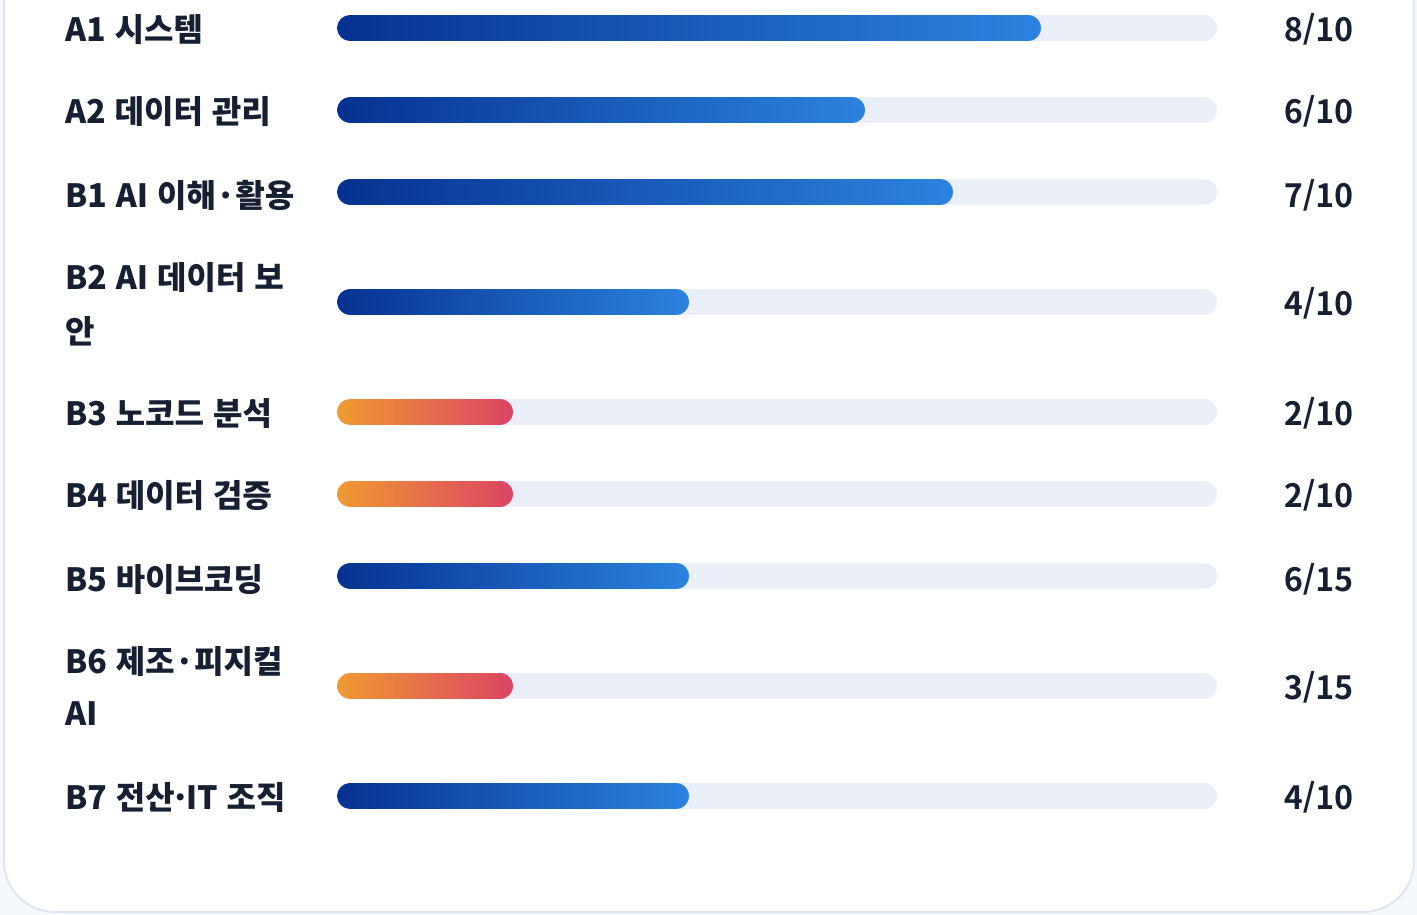

CONSULTING DIAGNOSIS

Level 2의 의미를 현장 실행 언어로 바꿉니다

① 데이터는 있지만 기준이 다를 수 있습니다

생산·품질·설비 파일을 연결하기 전에 품목, LOT, 설비, 시간, 불량유형의 공통 정의와 입력·검토 책임자를 정해야 합니다.

② AI 교육을 실제 업무에 붙일 수 있습니다

작업일보 요약, 주간보고 초안, 불량 원인 분류처럼 반복적이고 검증 가능한 업무부터 적용하면 빠른 효과를 확인할 수 있습니다.

③ 검증과 보안이 기술보다 먼저입니다

AI 입력 금지 정보, 마스킹 규칙, 원본 대조, 현업 승인 절차가 없으면 활용 범위가 넓어질수록 오류와 정보유출 위험이 커집니다.

④ 제조 AI는 한 공정으로 좁혀야 합니다

외관 불량 1종 또는 핵심 설비 1대를 선정해 데이터 품질과 사업효과를 검증한 뒤 확대하는 것이 적절합니다.

PRIORITY PORTFOLIO

기반 정비부터 확산까지 네 단계로 추진합니다

P1 **실행 기반 정비**

데이터 사전, 입력·검토·승인 책임, AI 보안 가이드, 생산·품질·설비·경영기획 AX TF를 정합니다.

P2

빠른 성과 과제

작업일보 자동 요약, 생산계획 대비 실적 Dashboard, 불량 분류, 설비정비 이력 월간 요약을 구현합니다.

P3

단일 현장 PoC

외관 불량 1종 또는 설비 1대를 대상으로 정확도, 검사·대응시간, 작업부담, 비용 효과를 비교합니다.

P4

검증 후 확산

효과가 확인된 과제를 MES·ERP와 연계하고 부서별 템플릿과 운영 가이드를 표준업무로 전환합니다.

12-WEEK ROADMAP

12주 안에 기준·자동화·PoC를 한 흐름으로 검증합니다

WEEK 1-4

기준 만들기

- 현행 양식과 시스템 확인
- 공통 데이터 필드 확정
- KPI 산식과 책임자 지정
- AI 보안·검증 기준 수립

WEEK 5-8

자동화와 Dashboard

- 반복 집계 자동화
- 주간보고 초안 생성
- 실제 샘플 데이터 연결
- 누락·오류 감소효과 측정

WEEK 9-12

단일 현장 PoC

- 불량 1종 또는 설비 1대
- 기준선과 목표치 합의
- 현업 판정과 AI 결과 비교
- 확대·보완·중단 결정

EIGHT CONSULTING SESSIONS

8회 컨설팅에 연결하는 권장 수행 구성

회차	핵심 주제	주요 산출물
1	진단 결과 검증과 현장 인터뷰	확인된 현안, 담당자, 우선 공정
2	데이터 흐름·양식 조사	데이터 맵, 파일·시스템 목록
3	KPI와 데이터 표준 정의	데이터 사전, KPI 정의서
4	Excel·생성형 AI 업무자동화	작업일보·주간보고 자동화 시안

회차	핵심 주제	주요 산출물
5	생산·품질·설비 Dashboard	핵심지표 Dashboard PoC
6	현장 AI 후보 검증	비전검사 또는 예지보전 PoC 기획
7	보안·검증·운영체계	AI 사용 가이드, RACI, 검증표
8	효과 분석과 AX 로드맵	투자 우선순위와 확산계획

해석 범위

현재 결과는 경영기획 응답 1건의 자가진단입니다. ERP/MES 실제 사용 범위, 최근 생산일보·검사표·정비이력, 불량 이미지와 설비 로그를 현장에서 확인한 뒤 전사 수준과 투자 우선순위를 확정해야 합니다.
